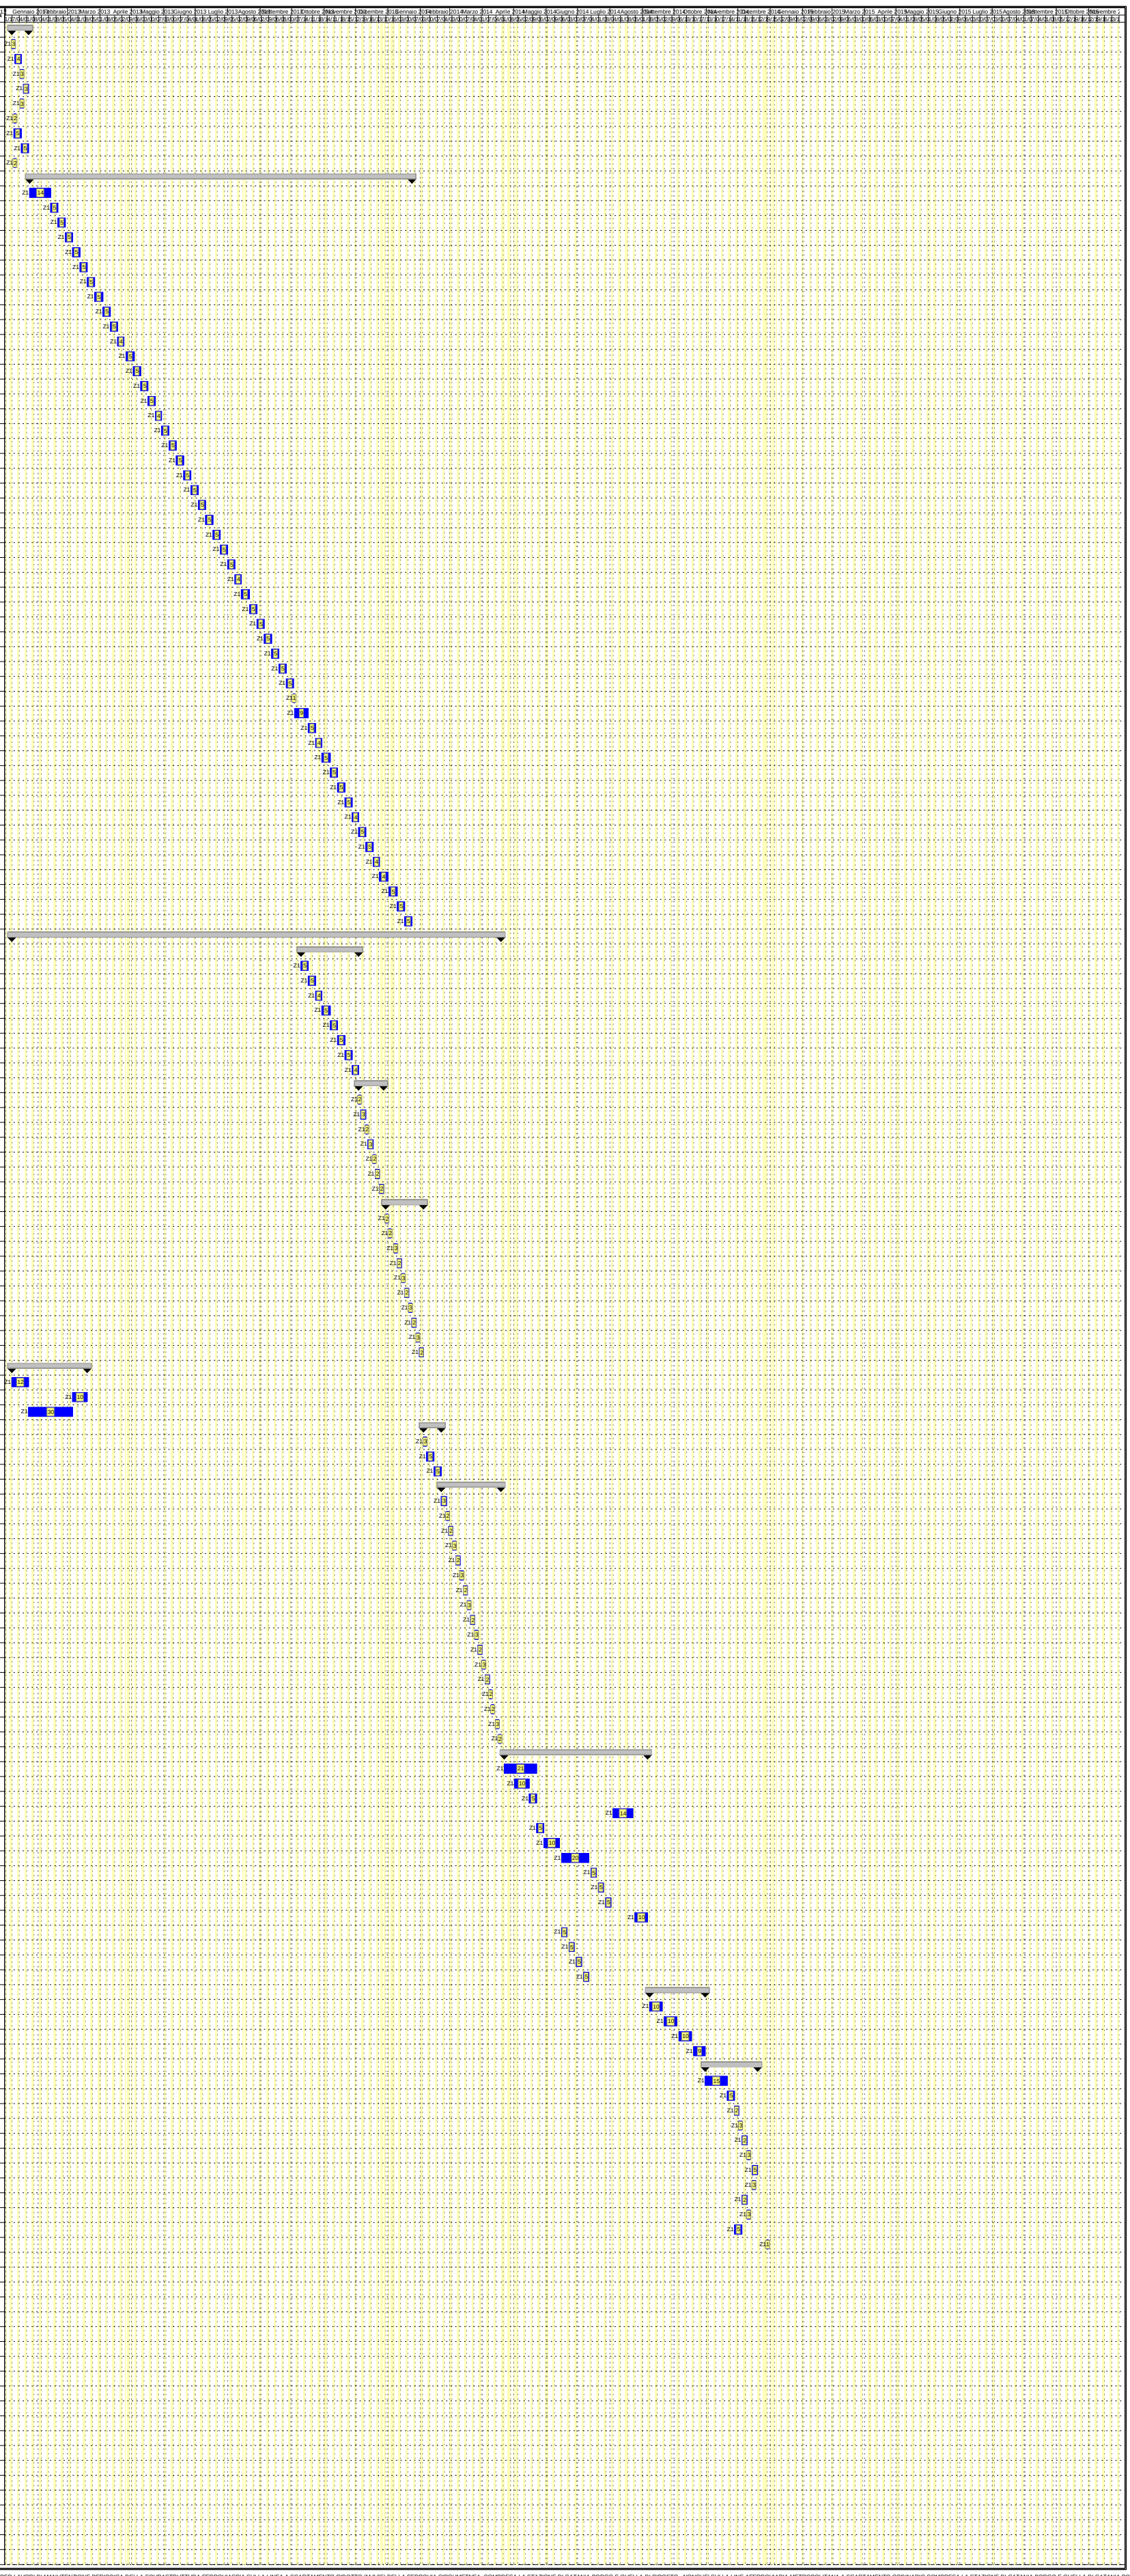Nome attività	Durata
ALLESTIMENTO CANTIERE	12 g
Operazioni di consegna dei lavori	3 g
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	4 g
Allestimento di cantiere temporaneo lungo linea ferrata	3 g
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e	3 g
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	3 g
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	2 g
Realizzazione della viabilità del cantiere	5 g
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	5 g
Allestimento di servizi sanitari del cantiere	2 g
INTERVENTI SUI FABBRICATI	252 g
Demolizione di pareti divisorie	14 g
Demolizione di tetto a falde con orditura in legno	5 g
Demolizione di tompagnature	5 g
Demolizione generale di murature portanti eseguita con impie	5 g
Taglio di travi, setti e pilastri in c.a.	5 g
Taglio parziale dello spessore di muratura	5 g
Rimozione di controsofffitature, intonaci e rivestimenti interni	5 g
Rimozione di impianti	5 g
Rimozione di manto di copertura in tegole	5 g
Rimozione di massetto	5 g
Rimozione di pavimenti esterni	4 g
Rimozione di ringhiere e parapetti	5 g
Rimozione di scossaline, canali di gronda, pluviali	5 g
Rimozione di serramenti interni	5 g
Sverniciatura e pulizia di superfici esterne	5 g
Svuotamento rinfianchi della volta	4 g
Formazione di massetto per esterni	5 g
Getto in calcestruzzo per opere non strutturali	5 g
Impermeabilizzazione di pareti controterra	5 g
Lavorazione e posa ferri di armatura per opere non strutturali	5 g
Posa di fossa biologica prefabbricata	5 g
Posa di pavimenti per esterni	5 g
Posa di recinzioni e cancellate	5 g
Formazione di massetto per pavimenti interni	5 g
Formazione intonaci interni (tradizionali)	5 g
Posa di pavimenti per interni	5 g
Realizzazione di divisori interni	4 g
Posa di serramenti interni	5 g
Realizzazione di contropareti e controsofffitti	5 g
Tinteggiatura di superfici interne	5 g
Ripristino di cls ammalorato di pilastri, travi, pareti	5 g
Ripristino di lesioni in strutture in c.a. con iniezioni di malta	5 g
Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie	5 g
Consolidamento strutture di fondazione	5 g
Getto in calcestruzzo per consolidamento solaio	1 g
Cuci scuci	9 g
Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento muratu	5 g
Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento solaio	4 g
Consolidamento del tavolato di solaio in legno	5 g
Consolidamento delle travi in legno mediante placcaggio	5 g
Consolidamento di volta in muratura	5 g
Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas	5 g
Realizzazione di impianto elettrico interno	4 g
Realizzazione di impianto termico (autonomo)	5 g
Realizzazione di impianto di messa a terra	5 g
Realizzazione di impianto telefonico e citofonico	4 g
Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata	4 g
Realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto an	5 g
Posa macchina di condizionamento	5 g
Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto	5 g
INTERVENTI SULLA SEDE	326 g
CONSOLIDAMENTI TERRENI	38 g
Getto di calcestruzzo di cordoli in c.a. per la stabilizzazio	5 g
Iniezioni di malta cementizia ad alta pressione in terreni	5 g
Iniezioni per consolidamento di terreni	4 g
Lavorazioni e posa ferri di armatura di cordoli in c.a. per	5 g
Perforazioni per la realizzazione di tiranti per il consolida	5 g
Posa reti e cavi di acciaio per la stabilizzazione di scarpa	5 g
Posizionamento e solidarizzazione di tiranti per il consol	5 g
Realizzazione della carpenteria di cordoli in c.a. per la st	4 g
OPERE DI SOSTEGNO	16 g
Getto di calcestruzzo per muri di sostegno in c.a.	2 g
Lavorazione e posa ferri di armatura per muri di sostegn	3 g
Posa dei ferri di armatura per paratia in c.a.	2 g
Posa di gabbionature metalliche	3 g
Realizzazione della carpenteria per muri di sostegno in c	2 g
Realizzazione di paratia in c.a.	2 g
Realizzazione di vespaio per muri controterra	2 g
SERVIZI E IMPIANTI A RETE	24 g
Rimozione di pali telefonici in legno	2 g
Getto in calcestruzzo per sottoservizi in c.a.	2 g
Lavorazione e posa ferri di armatura per sottoservizi in c	3 g
Posa di conduttura del gas	2 g
Posa di conduttura elettrica	3 g
Posa di conduttura idrica	2 g
Posa di conduttura telefonica	3 g
Posa di speco fognario prefabbricato	2 g
Pozzetti di ispezione e opere d'arte	3 g
Realizzazione della carpenteria per sottoservizi in c.a.	2 g
PROFILATURA BINARIO	52 g
Risezionamento del profilo del rilevato ferroviario	12 g
Profilatura del binario	10 g
Approvvigionamento e posa traversine e binari	30 g
INTERVENTI ALLA T.E.	13 g
Rimozione di pantografo T.E.	3 g
Posa di Linea di contatto	5 g
Pozzetti di ispezione e opere d'arte	5 g
VARIE	41 g
Drenaggio del terreno di scavo	3 g
Scavo a sezione obbligata	2 g
Montaggio di pannelli fonoassorbenti	2 g
Scavo eseguito a mano	3 g
Rinterro di scavo	2 g
Risezionamento del profilo del terreno	3 g
Approvvigionamento e posa traversine e binari	2 g
Cordoli, zanelle e opere d'arte	3 g
Formazione di fondazione stradale	2 g
Formazione di rilevato stradale	3 g
Formazione di manto di usura e collegamento	2 g
Taglio di asfalto di carreggiata stradale	3 g
Realizzazione di marciapiedi	2 g
Posa di segnali stradali	2 g
Posa di barriere protettive in c.a.	2 g
Montaggio di guard-rails	3 g
Montaggio di pannelli fonoassorbenti	2 g
INTERVENTI SULLE OPERE D'ARTE	95 g
Indagini geotecniche e prelievo di campioni	21 g
Sondaggio geomeccanico	10 g
Esecuzione di indagini geognostiche con prove dinamiche	5 g
Montaggio di strutture orizzontali in acciaio	14 g
Valutazione della portanza del terreno mediante carichi statici	5 g
Consolidamento strutture di fondazione	10 g
Ripristino di cls ammalorato di pilastri, travi, pareti	20 g
Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento muratu	5 g
Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie	5 g
Realizzazione della carpenteria di solaio in acciaio-calcestruzz	5 g
Montaggio di strutture verticali in acciaio	10 g
Perforazioni in elementi opachi	5 g
Posa di piastre di ancoraggio per tiranti	5 g
Posa di tiranti verticali in acciaio armonico	5 g
Posa di tiranti orizzontali in acciaio	5 g
IMPIANTI AUTOMATICI	39 g
Posa cavi IS	10 g
Giunzione cavi IS	10 g
Infilaggio e attestazione cavi IS alle morsettiere	10 g
Giunzione cavi F.O.	9 g
DISFACIMENTI E RIMOZIONI (AMIANTO)	35 g
Incapsulamento di coperture in cemento amianto	15 g
Realizzazione di un confinamento artificiale delle fibre d'amiar	5 g
Realizzazione di un'area di decontaminazione del personale	2 g
Rimozione di amianto coibente di tubazioni o canalizzazioni o	3 g
Rimozione di canna di ventilazione o fumaria, tubazioni o gron	2 g
Rimozione di controsofffitature o partizioni orizzontali contene	3 g
Rimozione di coperture in cemento amianto	5 g
Rimozione di intere strutture costituite da elementi contenenti	3 g
Rimozione di partizioni verticali contenenti amianto	2 g
Rimozione di pavimentazioni contenenti amianto	3 g
Rimozione di piccole quantità di amianto coibente di tubazioni	5 g
Smobilizzo del cantiere	1 g
LEGENDA Zona:	
Z1 = ZONA UNICA
